Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio
Diagramma di Gantt	313/446	01/06/2020
Allestimento cantiere	4/5	01/06/2020
Baracche di cantiere	2/2	04/06/2020
Delimitazione dell'area con elementi in legno	2/2	04/06/2020
Delimitazione dell'area di cantiere	2/3	01/06/2020
Installazione e smontaggio cantiere generico	4/5	01/06/2020
Rimozione di impianti	9/9	08/06/2020
Rimozione di apparecchi idro-sanitari	2/2	11/06/2020
Rimozione di infissi esterni	3/3	15/06/2020
Rimozione di infissi interni	3/3	15/06/2020
Demolizione di strutture in calcestruzzo	7/9	18/06/2020
Smantellamento del manto di copertura	3/3	22/06/2020
Rimozione di canali e discendenti	3/3	22/06/2020
Demolizione di tramezzi	2/2	25/06/2020
Demolizione di solaio in latero cemento	5/5	29/06/2020
Demolizione di murature a mano	5/5	06/07/2020
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	3/5	09/07/2020
Demolizione di massetto	3/5	09/07/2020
Lavori all'interno di camere non ventilate	15/19	15/06/2020
Rinforzo con tessuti in fibra di carbonio di muratura	15/19	15/06/2020
Rinforzo con tessuti in fibra di carbonio di travi in c.a.	15/19	15/06/2020
Rinforzo nodo trave pilastro con fasciatura con tessuti in fibra dicarbonio	15/19	15/06/2020
Riprese di murature (cuci-scuci)	5/5	29/06/2020
Consolidamento murature con intonaco armato	29/37	03/08/2020
Rimozione di caldaia	5/5	08/06/2020
Posa di caldaia a condensazione	5/5	13/07/2020
Montaggio controsoffitti antisfondellamento	10/14	06/08/2020
Rimozione di vecchie pitture a mano	10/12	20/07/2020
Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	15/19	10/08/2020
Esecuzione di puntellature di coperture con elementi in legno e metallo	10/12	20/07/2020
Demolizione di murature a mano	14/18	31/08/2020
Pilastri in calcestruzzo armato	13/17	07/09/2020
Travi di collegamento in cemento gettato in opera	13/17	07/09/2020
Montaggio di strutture in acciaio	15/21	24/09/2020
Montaggio controventature metalliche	15/21	24/09/2020
Sottomurazioni	10/14	24/09/2020
Scavi a sezione obbligata a mano	2/2	01/10/2020
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	6/6	01/10/2020
Fondazioni in cls armato	8/10	05/10/2020
Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici	2/2	15/10/2020
Vespaio controterra con pietrame aerato	2/2	19/10/2020
Demolizione di pavimento e massetto	3/3	21/10/2020
Massetto in conglomerato cementizio anti radon	10/12	21/10/2020
Impermeabilizzazione pavimenti con guaina bituminosa anti radon	6/6	28/10/2020
Setti in calcestruzzo armato	30/43	30/10/2020
Solaio in latero cemento gettato in opera	19/23	16/11/2020
Muratura con isolamento in fibre vetrose	15/23	07/12/2020
Montaggio infissi esterni in metallo	15/19	11/01/2021
Smontaggio tetto in legno senza capriate	5/5	01/02/2021
Massetto in conglomerato cementizio	18/27	30/12/2020
Copertura in legno	10/10	01/02/2021
Montaggio di pannelli per chiusura orizzontale	10/10	08/02/2021
Realizzazione manto di copertura in pannelli prefabbricati	10/10	08/02/2021
Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio	10/10	08/02/2021
Montaggio sistema linee vita su copertura a 4 falde	5/5	22/02/2021
Posa delle tubazioni	9/13	04/03/2021
Impianto idrico sanitario	9/13	04/03/2021
Adduzione e scarico acque	9/13	04/03/2021
Divisori con blocchi in cls aerato autoclavato	3/3	01/03/2021
Divisori in laterizio	3/3	01/03/2021
Intonaco interno tradizionale manuale	10/10	15/03/2021
Divisori in cartongesso	12/14	01/03/2021
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	13/15	08/03/2021
Posa di canalette portacavi edifici abitativi	13/15	08/03/2021
Posa cavi e conduttori	13/15	08/03/2021
Montaggio infissi esterni in metallo con avvolgibile	5/5	22/03/2021
Facciate continue a montanti e traversi	5/7	25/03/2021
Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	21/28	01/04/2021
Montaggio controsoffitti modulari in fibra	5/5	03/05/2021
Posa in opera di soglie per finestre	6/6	12/04/2021
Pavimenti di varia natura	16/20	13/04/2021
Realizzazione di rivestimenti	4/6	13/05/2021
Montaggio infissi interni in legno	5/7	19/05/2021
Montaggio infissi interni in metallo	6/6	10/05/2021
Montaggio corpi radianti ed accessori	5/5	14/06/2021
Completamento impianto elettrico interno	5/5	21/06/2021
Posa in opera di battiscopa	6/8	24/05/2021
Posa delle apparecchiature igieniche	8/11	01/06/2021
Montaggio idro-sanitari e accessori vari	8/11	01/06/2021
Impianto ascensore oleodinamico	10/12	14/06/2021
Sistema a cappotto con EPS facciata esterna	20/26	05/07/2021
Montaggio ringhiere in alluminio per balconi	3/3	28/06/2021
Montaggio di pluviali	14/18	19/04/2021
Tinteggiatura pareti esterne	30/38	26/04/2021
Manutenzione e revisione manto copertura	15/19	12/07/2021
Realizzazione di scala esterna metallica	20/26	26/07/2021
Pavimentazioni esterne	10/12	09/08/2021
Smobilizzo cantiere	0/0	---
Delimitazione dell'area con elementi in legno	0/0	---
Delimitazione dell'area di cantiere	0/0	---
Installazione e smontaggio cantiere generico	0/0	---

LEGENDA AREE DI CANTIERE

- Intero cantiere (rosso)
- Corpo A (verde)
- Corpo B (giallo)
- Corpo C (blu)

PIANTA CHIAVE - PIANO TERRA

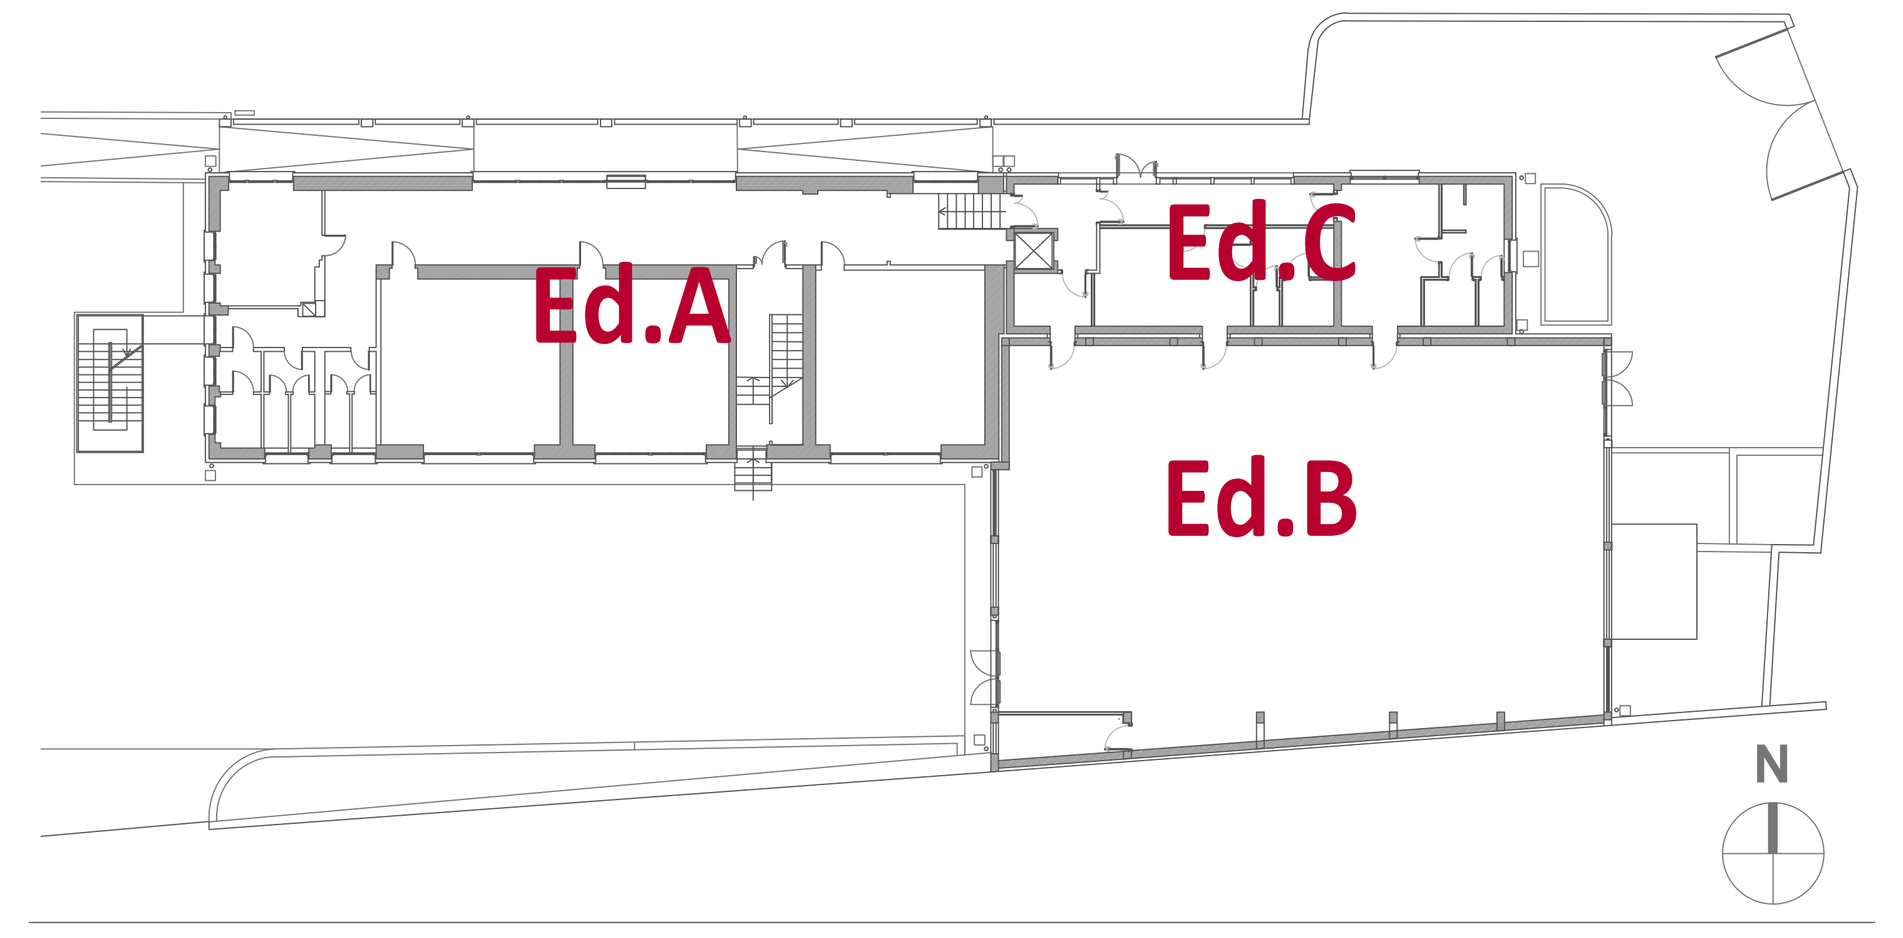

COMUNE DI COSIO VALTELLINO

Provincia di Sondrio

P.zza S. Ambrogio n. 21 - 23013 - Cosio Valtellino

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI COSIO

CIG: 7721132FAD

PROGETTO ESECUTIVO

GENERALI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: DIAGRAMMA DI GANTT

ELABORATO: **D-GE028**

SCALA: /

AGGIORNAMENTO: REV.00 26.09.2019 REV.01 30.11.2019

N° PRATICA: 2019.03

FILE: 2019.03_ESE_DG28_REV01.dwg

DATA: 30 novembre 2019

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

R.U.P. (Responsabile del Servizio):
DOTT. PIERGIORGIO MARTINELLI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

MIGLIORE STASS Studi Associati
(Prof. Ing. Mario Rosario Migliore, Arch. Anna Paola Migliore, Ing. Stefano Ciaramella) - Capogruppo
Napoli - Via Nuova Cinthia 40, cap. 80126 - tel. 081/627768

ARCH. RAFFAELLA CUSANO

ING. DOMENICO GRECO

CONSULENTE:
AECODE S.R.L. - ARCH. ANGELO PICCOLO (Modellazione BIM)
